大学新生入学管理系统

(SN001)项目开发计划

文件信息					
文件状态	[] 草稿[] 正在修改[√] 正式发布				
文件标识	20170925				
当前版本	1.0				
作	作者				
姓名	白星月				
学号	2014011417				
团队 Supreme					
完成日期 2017/9/25					
版本更新信息					

目录

1	1 引言	3
	1.1 使用人员	3
	1.2 编写目的	3
	1.3 背景	3
	1.4 定义与缩写	4
	1.5 参考资料	4
2	2 项目概述	4
	2.1 工作内容	4
	2.2 主要参加人员	5
	2.3 产品	5
	2.4 验收标准	8
	2.5 完成项目的最迟期限	8
3	3 实施计划	8
	3.1 角色定义及分配	8
	3.2 过程域方法与工具	9
	3.3 任务与进度	9
	3.4 预算	10
	3.5 关键问题	11
4	4 支持条件	11
	4.1 计算机系统支持	11
	4.2 需由用户承担的工作	11
	4.3 由外单位提供的条件	11
5	5 专题计划要点	12

1 引言

1.1 使用人员

Supreme 小组成员

1.2 编写目的

为了保证项目团队按时保质地完成项目目标,便于项目团队成员更好地了解项目情况,使项目工作开展的各个过程合理有序,有必要以文件化的形式,把对于在项目生命周期内的工作任务范围、各项工作的任务分解、项目团队组织结构、各团队成员的工作责任、团队内外沟通协作方式、开发进度、经费预算、项目内外环境条件、风险对策等内容以书面的方式描述出来,作为项目团队成员以及项目干系人之间的共识与约定,项目生命周期内的所有项目活动的行动基础,项目团队开展和检查项目工作的依据。

本项目开发计划用于总体上知道《大学新生入学管理系统》项目顺利进行并最终得到通过评审的项目产品。本项目开发计划面向项目组全体成员。

1.3 背景

- a.待开发的软件系统的名称: 大学生新生入学管理系统
- b.本项目的任务提出者: Supreme 团队

本项目的开发者: Supreme 团队

c.本系统面向所有在校师生

1.4 定义与缩写

术语	SDP
解释	Software development plan 软件
	项目开发计划
术语	
解释	应用中的业务逻辑或流程

1.5 参考资料

[1]软件项目管理案例教程 机械工业出版社 ISBN 7-111-155591-2 [2]软件需求(第三版) 清华大学出版社 ISBN 978-7-302-42682-0 [3]Java 项目开发全程实录 清华大学出版社 ISBN 978-7-302-17233-8

2 项目概述

2.1 工作内容

本项目主要对大学新生入学管理系统进行开发,主要工作是对大 学新生入学管理系统进行需求分析、概要设计、详细设计、编码实现、 单元测试、集成测试、验收交付。

2.2 主要参加人员

姓名	性别	学系	技能
白星月	女	软件工程系	Java、ASP、Android 编程
张熠阳	男	软件工程系	Java、C/C++编程
张新杰	女	软件工程系	软件测试技术
李志伟	男	软件工程系	Java 编程
李达飞	男	软件工程系	Java、Java web 后端编程
徐刘凯	男	软件工程系	PS、视频剪辑、Java、网页前端设计
果红艳	女	软件工程系	Java、Java web 后端编程
唐锐	女	软件工程系	软件测试技术
杨玲玲	女	软件工程系	软件测试技术
刘绍颖	女	软件工程系	软件测试技术
张娅娅	女	软件工程系	Java 编程

2.3 产品

程序:

移交给用户的内容包括大学新生入学管理系统、系统数据库、以 及相关的文档、操作说明、培训计划。

文件:

文件名 内容要点

项目开发计划	确定详细的项目实施范围、定义 递交的工作成果、评估实施过程 中主要的风险、制定项目实施的 时间计划、成本和预算计划、人力资源计划等。
测试案例	软件测试所用的案例资料
测试报告	软件测试最终形成的报告
测试计划	软件测试总体计划
概要设计说明书	软件系统概要设计说明
可行性分析报告	软件系统开发前研发前的可行性 分析
评审报告	软件系统开发过程中的各个阶段 的评审
缺陷跟踪	软件系统中各个阶段的缺陷跟踪
任务书	软件系统的任务分解
软件过程定义	软件所需完成的任务的框架
软件需求说明书	软件需求分析
投标书	投标单位按照招标书的条件和要 求,向招标单位提交的报价并填 具标单的文书。
详细设计说明书	软件系统详细设计

项目变更评估	软件系统开发过程中变更评估
项目变更申请	软件系统开发过程中变更申请
项目进展报告	软件系统开发进展报告
项目总结	软件系统开发总结
验收报告	软件系统交付前的验收报告
用户手册	用户系统使用说明书

服务:

为保证工期、施工质量和项目的平稳交接,在项目系统分析、软件开发、软件测试阶段,我方邀请用户方人员为项目开发组提供咨询和指导,并为此提供方便;

系统的安装、调试和试运行,邀请用户方人员共同参加,并根据 用户方意见对系统进行修改;

在系统投入运行之后提供定期及不定期的维护,以保证系统处于 良好的运行状态。维护工作将在用户认为方便并做出适当安排的情况 下进行;

在系统的开发、安装、调试和试运行工程中,结合实际向用户介绍系统的技术细节,安排专门的时间为用户提供系统的使用和维护培训。

非移交的产品:

系统源代码

2.4 验收标准

大学新生入学管理系统:系统成功运行并能支持多人同时访问。、

系统数据库:运行成功。

2.5 完成项目的最迟期限

2017/11/20

3 实施计划

3.1 角色定义及分配

人员	管理组	开发组	测试组	用户组
白星月	项目经			
	理			
张熠阳	(兼)	组长(设计		
		师)		
张新杰	(兼)		组长	
李志伟		系统分析、		
		文档撰写		
徐刘凯		编程、单元		
		测试		
果红艳		编程、单元		

	测试		
李达飞	编程、单元 测试		
唐锐		集成测试	
杨玲玲		集成测试	
刘绍颖		文档撰写	
张娅娅			需求评审、
			验收测试

3.2 过程域方法与工具


MyEclipse 2016 CI 6
MySQL

3.3 任务与进度

任务与进度计划:

大学新生入学管理系统	44 个工作日 2017年9月25日 2017年11月23日
策划	6 个工作日 2017年9月25日 2017年10月1日
任务书	6 个工作日 2017年9月25日 2017年10月1日 项目经理
项目开发计划	6 个工作日 2017年9月25日 2017年10月1日 项目经理
需求分析	12 个工作日 2017年10月1日 2017年10月14日 需求分析师, 用户, 测试员, 项目经理
可行性分析	12 个工作日 2017年10月1日 2017年10月14日 需求分析师
软件需求说明书	12 个工作日 2017年10月1日 2017年10月14日 项目经理,需求分析师
需求测试	12 个工作日 2017年10月1日 2017年10月14日 测试员,用户
设计	7 个工作日 2017年10月14日2017年10月21日 程序员, 项目经理, 需求分析师
概要设计	7 个工作日 2017年10月14日 2017年10月21日 程序员,项目经理
详细设计	7 个工作日 2017年10月14日 2017年10月21日 程序员,项目经理
设计测试	7 个工作日 2017年10月14日 2017年10月21日 測试员
实现	12 个工作日 2017年10月21日2017年11月6日 程序员
编写代码	12 个工作日 2017年10月21日 2017年11月6日 程序员
执行文件	12 个工作日 2017年10月21日 2017年11月6日 程序员
单元测试	12 个工作日 2017年10月21日 2017年11月6日 测试员,程序员
测试	11 个工作日 2017年11月6日 2017年11月20日 测试员,程序员,用户
单元测试实例	11 个工作日 2017年11月6日 2017年11月20日 测试员
单元测试报告	11 个工作日 2017年11月6日 2017年11月20日 測试员
修改代码	11 个工作日 2017年11月6日 2017年11月20日 程序员
集成测试实例	11 个工作日 2017年11月6日 2017年11月20日 测试员,用户
集成测试报告	11 个工作日 2017年11月6日 2017年11月20日 测试员
修改代码	11 个工作日 2017年11月6日 2017年11月20日 程序员
系统测试报告	11 个工作日 2017年11月6日 2017年11月20日 测试员
用户使用手册	11 个工作日 2017年11月6日 2017年11月20日 测试员,程序员
交付	4 个工作日 2017年11月20日2017年11月23日 程序员,项目经理,用户
用户验收	4 个工作日 2017年11月20日 2017年11月23日 用户

甘特图:

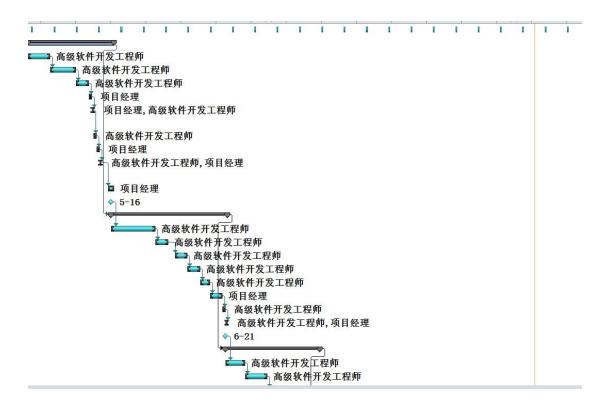

3.4 预算

序号	名称	来源说明	金额	备注
			(元)	
1	软件开发	北京信息科技	0	
		大学		
2	需求调研	北京信息科技	0	
		大学		
3	人员培训	北京信息科技	0	
		大学		

3.5 关键问题

- 1.明确需求,分析需求。
- 2.与用户进行沟通与交流,保证项目平稳进行。

4 支持条件

4.1 计算机系统支持

硬件:

Intel Core i5 以上 CPU 2.50GHz 已安装的内存(RAM) 8.00GB

软件:

MySQL、MyEclipse、Windows 8 以上系统。

4.2 需由用户承担的工作

- 1.用户尽可能明确和清晰地表达出系统的需求。
- 2.用户对我团队所做出的需求分析进行评审。
- 3.用户对我团队所完成的系统进行黑盒测试。
- 4.用户对我团队所完成的系统进行验收。

4.3 由外单位提供的条件

本系统由 Supreme 团队开发,不外包给别的单位。

5 专题计划要点

无
